



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-467-12-D	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
04 DE OCTUBRE DE 2012	11 DE OCTUBRE DE 2012

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)
----------------------------	-----------------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/0552/2012 3022001/4912/2012	DÍA 09 11	MES 03 10	AÑO 2012 2012
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ELBA CONSTRUCCIONES, S.A.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ECO 831027 BX3
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P0718

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL EJ. 5 DE MAYO, MPIO. DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 231,732.92 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL CONTRATO \$ 268,810.19 CON I.V.A. (16%)
IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) \$ 69,519.88 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL ANTICIPO \$ 80,643.06 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO \$ 80,643.06	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO \$ 23,173.29

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario **60 (SESENTA)**

FECHA DE INICIACIÓN 18 DE OCTUBRE DE 2012	FECHA DE TERMINACIÓN 16 DE DICIEMBRE DE 2012
---	--

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO N°.- SOP-IE-AP-467-12-D**

EN CD. VICTORIA, TAM., SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y EL ING. MANUEL GONZALEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑÍA ELBA CONSTRUCCIONES, S. A DE C. V A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA": EL LIC. ALDO FABRIZIO CEDILLO SILVA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

SIENDO LA CONTRALORIA GUBERNAMENTAL QUIEN ATESTIGUA ESTE ACTO.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL EJIDO 5 DE MAYO, MPIO. DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.


LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. SOP-IE-AP-467-12-D, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2012, ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 268,810.19 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 19/100 M.N) INCLUYE I.V.A.


DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

1.-EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	438.59
2.-PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	62.66
3.-SUMINISTRO-INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC. CON COPLE INTEGRAL DE 51MM (2") DE DIAMETRO.	ML	1139.20
4.-RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS AL 90%PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	155.89
5.-RELLENO COMPACTADO AL 90%PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3	218.58
6.-VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAFO FIJO DE 125 PSI Y DE 51MM (2") DE DIAMETRO.	PZA	1.00
7.-SUMINISTRO-INSTALACION Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA,EN PREDIOS,INCLUYE ABRAZADERA P.V.C DE 2" DE DIAMETRO CON SALIDA A ½" DE DIAMETRO,ADAPTADOR DE INSERCCION CON CUERDA DE ½" CIEMPAQUE,MANGUERA MULTICAPA PE-AL-PE DE ½" DE DIAMETRO,CODOS,TEE DE FO.GO,TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE ½",VALVULA DE GLOBO INTERIOR DE ½",LLAVE DE BRONCE PARA MANGUERA,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO,EXCAVACIONES,PLANTILLAS,RELLENOS Y TODO LO NECEZARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	TOM	30.00
8.-CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS,MEDIDAS INTERIORES TIPO 9 DE 1.20 X 0.90	PZA	1.00

VIGENCIA O PLAZO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO N°.- SOP-IE-AP-467-12-D**

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE (LOS) CONVENIOS DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CONVENIO(S) NUMERO(S)	DEL	AL
-----------------------	-----	----

FECHA DE TERMINACIÓN REAL:

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012

RELACION DE ESTIMACIONES:


EST No.	PERIODO	IMPORTE (\$) S/I.V.A.	AMORTIZACION ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
I	18 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	0.00	80,643.06	-	-
II	1° AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	80,643.06	-	-
III	1° AL 16 DE DICIEMBRE	231,720.61	80,643.06	0.00	1,622.04	-
	TOTALES	231,720.61	80,643.06			

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES:

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A. (\$)	IMPORTE S/I.V.A. (\$)
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	268,810.19	231,732.92
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	268,795.91	231,720.61
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	14.28	12.31
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	268,795.91	231,720.61
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00

FINIQUITO:


**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO N°.- SOP-IE-AP-467-12-D**

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACION No. 1 A LA No. 3	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$268,795.91	-	-

(*) IMPORTES QUE NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
*	*	*


DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL LIC. ALDO FABRIZO CEDILLO SILVA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"(FINIQUITO)

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

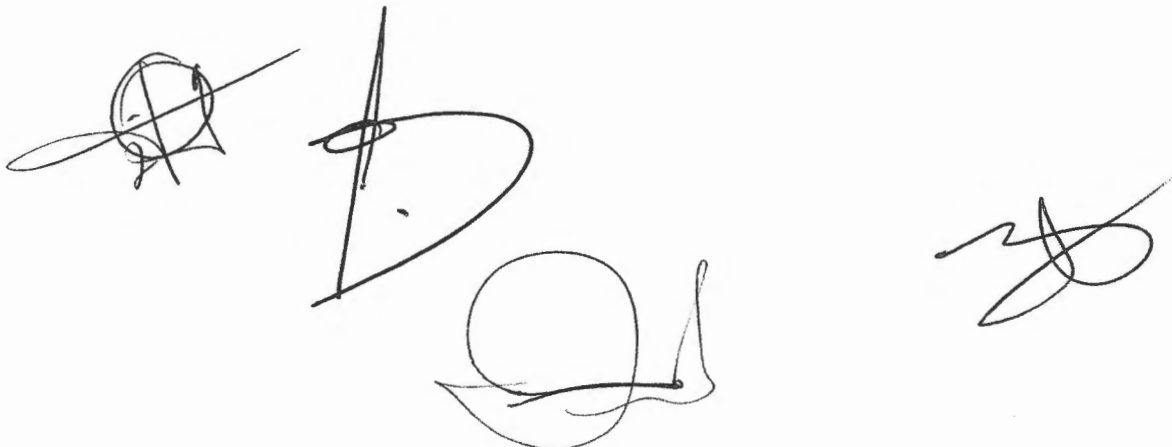

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO N°.- SOP-IE-AP-467-12-D**

**ENTREGA
ELBA CONSTRUCCIONES, S.A
CONTRATISTA**




**LIC. ALDO FABRIZIO CÉDILLO SILVA
REPRESENTANTE LEGAL**


**RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**



**ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION DE OBRAS REGION
CENTRO**



**ING. MANUEL GONZALEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA**



CONTRALORIA GUBERNAMENTAL
